



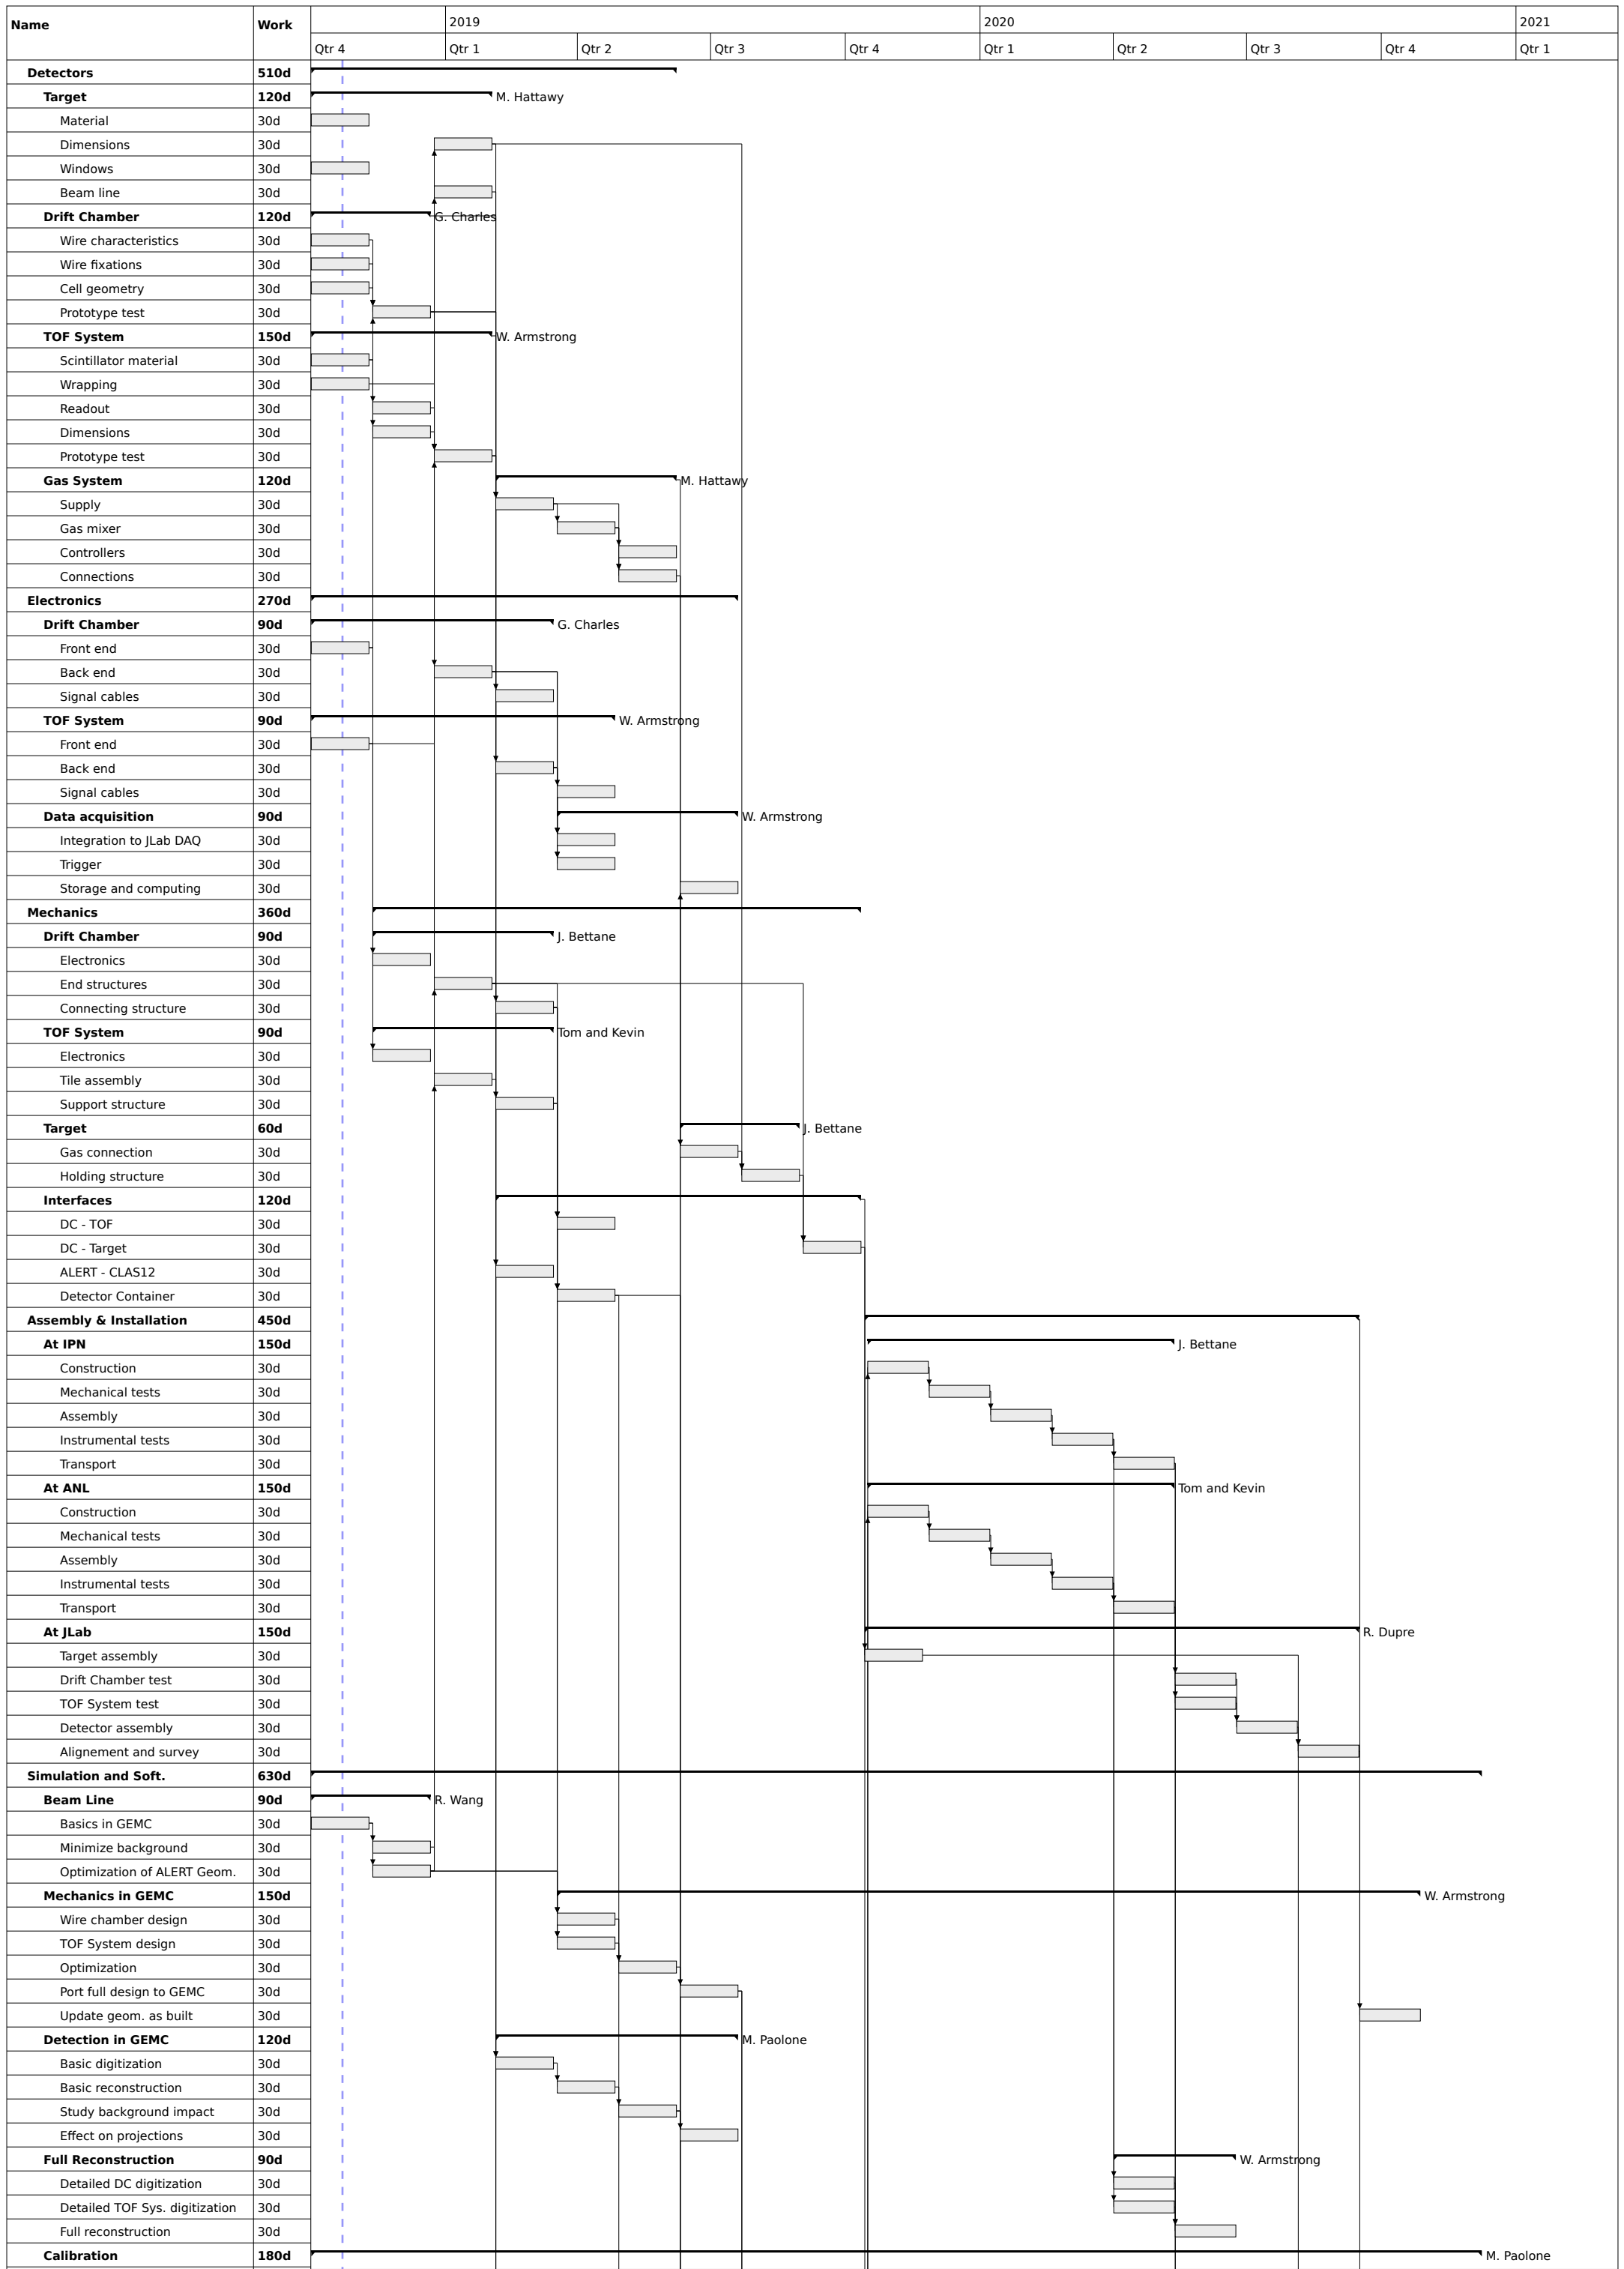

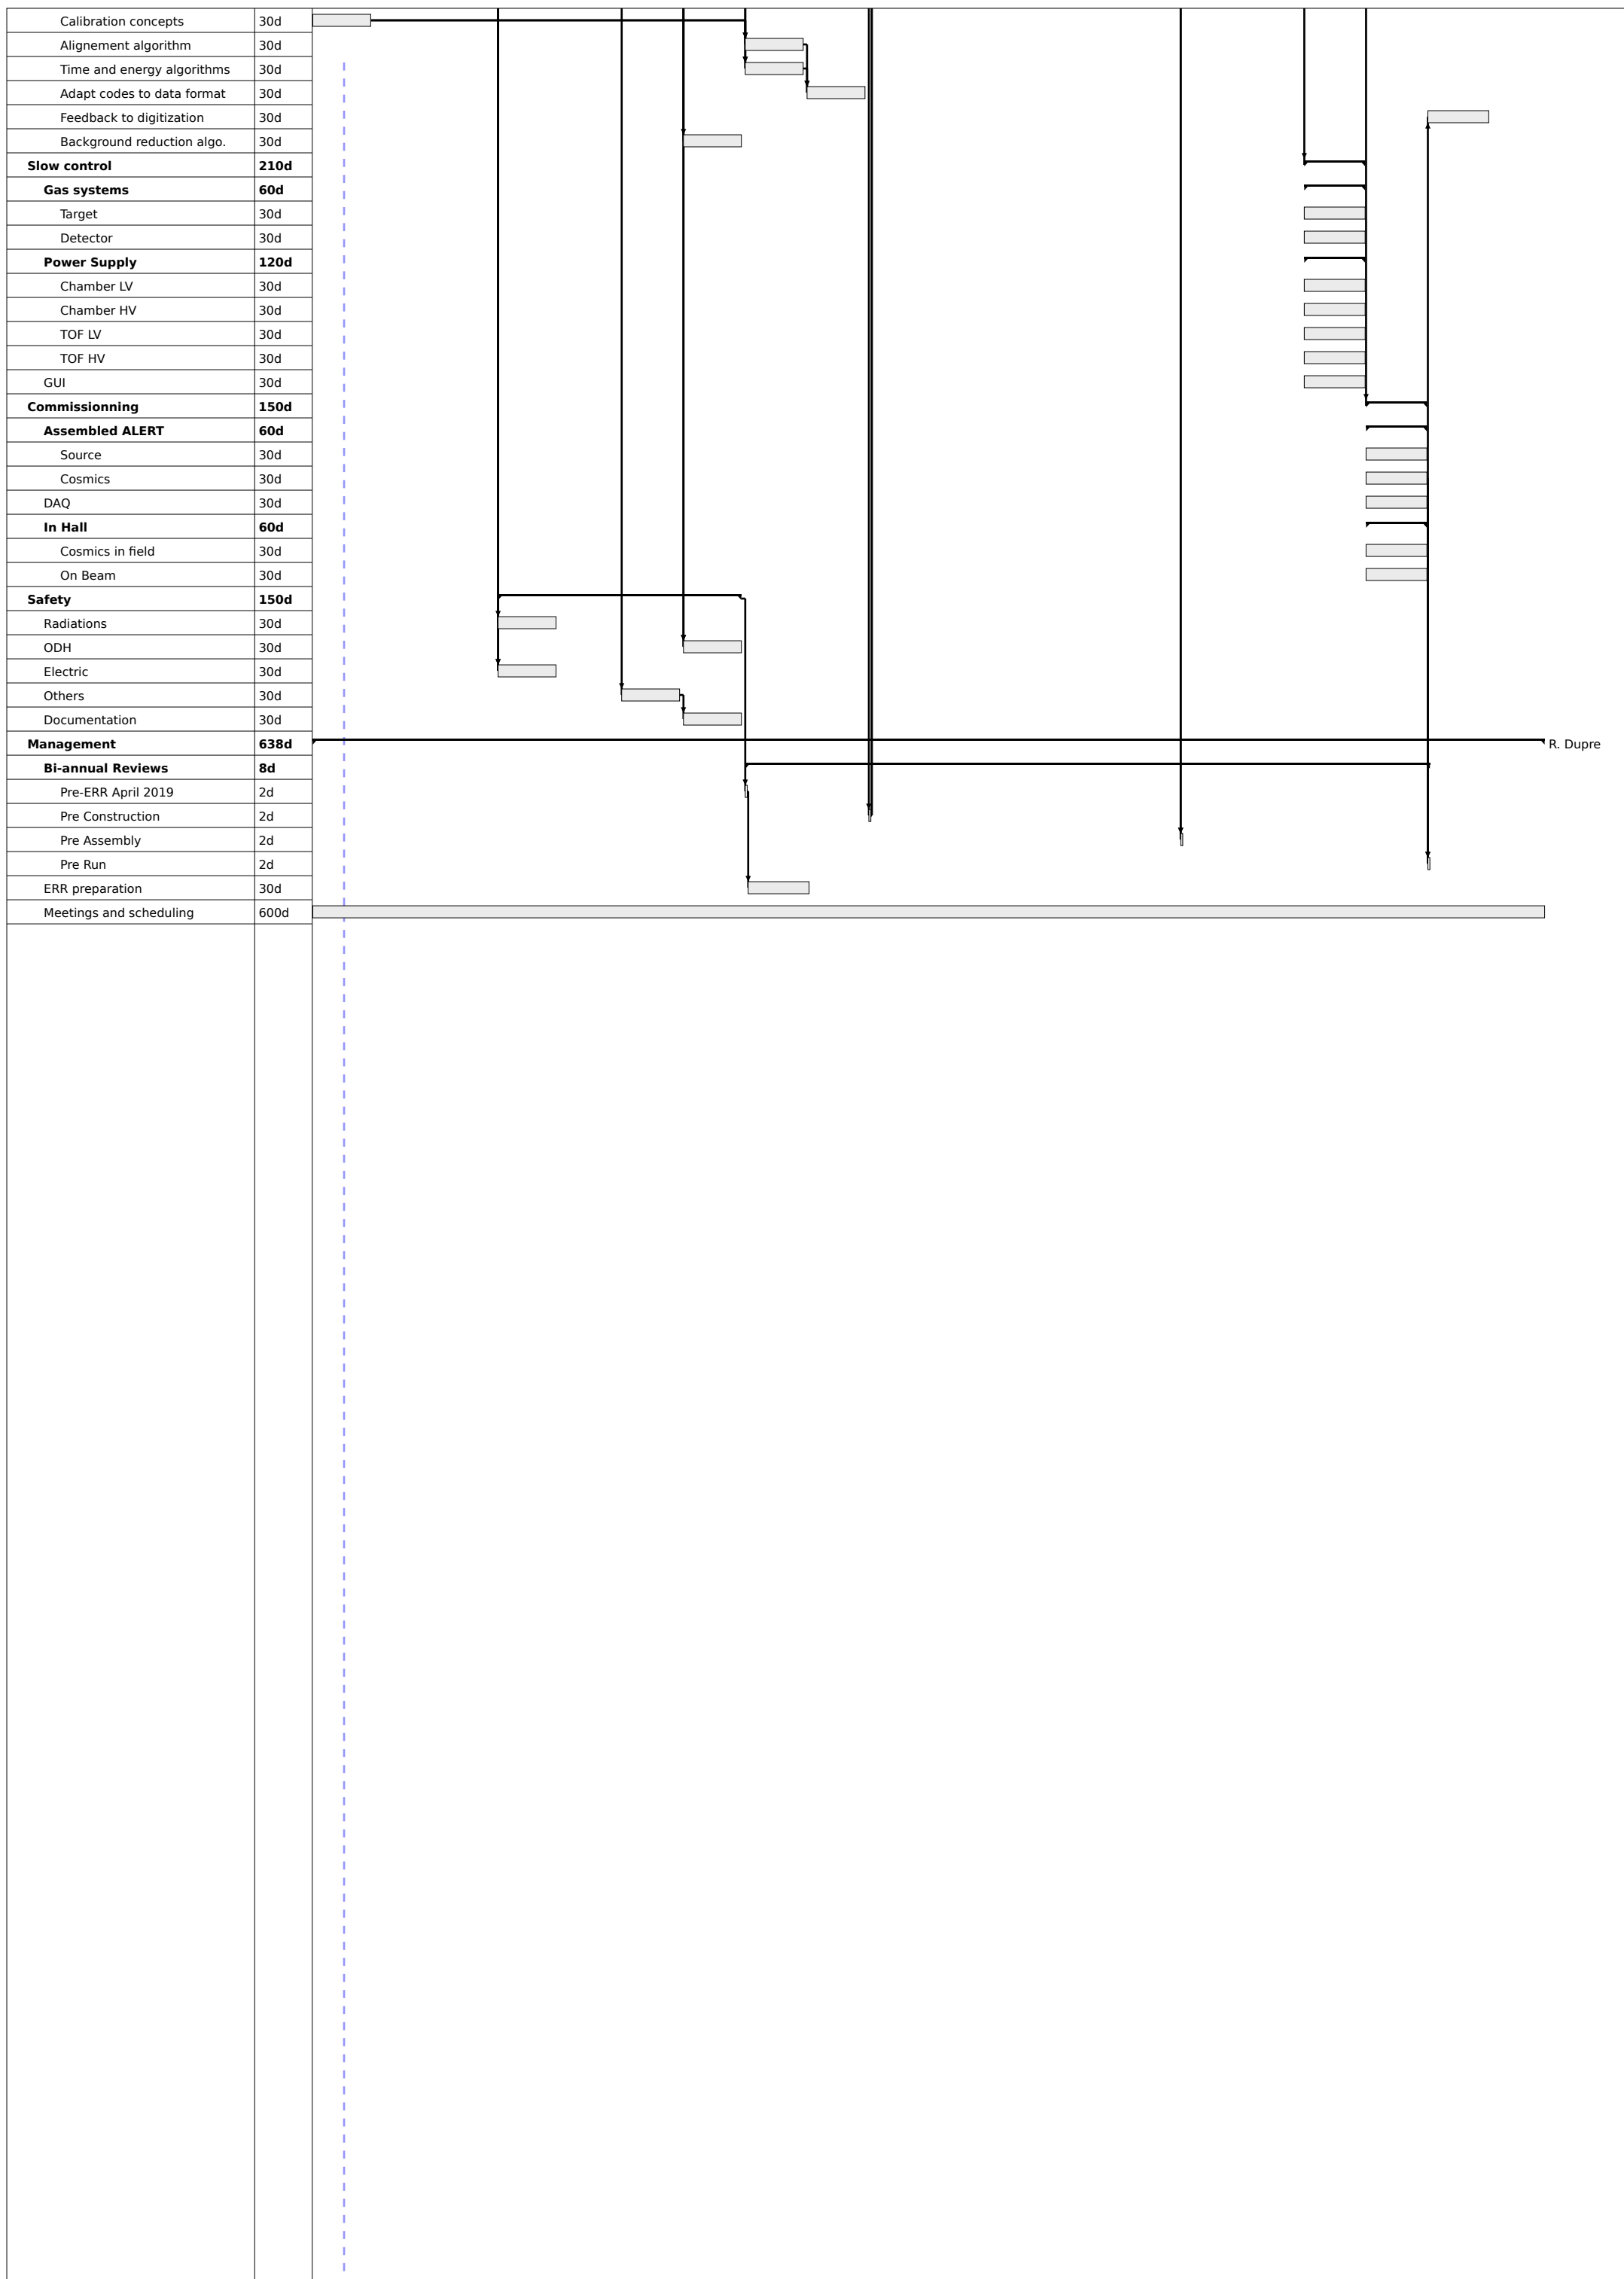

WBS	Name	Start	Finish	Work	Duration	Slack	Cost	Assigned to	% Complete
1	Detectors	oct. 1	juin 7	510d	180d	420d	0		0
1.1	Target	oct. 1	févr. 1	120d	90d	510d	0	M. Hattawy	0
1.2	Drift Chamber	oct. 1	déc. 21	120d	60d	476d	0	G. Charles	0
1.3	TOF System	oct. 1	févr. 1	150d	90d	446d	0	W. Armstrong	0
1.4	Gas System	févr. 4	juin 7	120d	90d	356d	0	M. Hattawy	0
2	Electronics	oct. 1	juil. 19	270d	210d	390d	0		0
2.1	Drift Chamber	oct. 1	mars 15	90d	120d	480d	0	G. Charles	0
2.2	TOF System	oct. 1	avril 26	90d	150d	450d	0	W. Armstrong	0
2.3	Data acquisition	mars 18	juil. 19	90d	90d	390d	0	W. Armstrong	0
3	Mechanics	nov. 12	oct. 11	360d	240d	330d	0		0
3.1	Drift Chamber	nov. 12	mars 15	90d	90d	480d	0	J. Bettane	0
3.2	TOF System	nov. 12	mars 15	90d	90d	480d	0	Tom and Kevin	0
3.3	Target	juin 10	août 30	60d	60d	360d	0	J. Bettane	0
3.4	Interfaces	févr. 4	oct. 11	120d	180d	55d	0		0
4	Assembly & Installation	oct. 14	sept. 15	450d	242d	56d	0		0
4.1	At IPN	oct. 16	mai 12	150d	150d	146d	0	J. Bettane	0
4.2	At ANL	oct. 16	mai 12	150d	150d	146d	0	Tom and Kevin	0
4.3	At JLab	oct. 14	sept. 15	150d	242d	56d	0	R. Dupre	0
5	Simulation and Soft.	oct. 1	déc. 8	630d	572d	28d	0		0
5.1	Beam Line	oct. 1	déc. 21	90d	60d	540d	0	R. Wang	0
5.2	Mechanics in GEMC	mars 18	oct. 27	150d	422d	58d	0	W. Armstrong	0
5.3	Detection in GEMC	févr. 4	juil. 19	120d	120d	390d	0	M. Paolone	0
5.4	Full Reconstruction	avril 1	juin 23	90d	60d	148d	0	W. Armstrong	0
5.5	Calibration	oct. 1	déc. 8	180d	572d	28d	0	M. Paolone	0
6	Slow control	août 5	sept. 15	210d	30d	88d	0		0
6.1	Gas systems	août 5	sept. 15	60d	30d	88d	0		0
6.2	Power Supply	août 5	sept. 15	120d	30d	88d	0		0
6.3	GUI	août 5	sept. 15	30d	30d	88d	0		0
7	Commissionning	sept. 16	oct. 27	150d	30d	58d	0		0
7.1	Assembled ALERT	sept. 16	oct. 27	60d	30d	58d	0		0
7.2	DAQ	sept. 16	oct. 27	30d	30d	56d	0		0
7.3	In Hall	sept. 16	oct. 27	60d	30d	58d	0		0
8	Safety	févr. 4	juil. 19	150d	120d	356d	0		0
9	Management	oct. 1	janv. 15	638d	600d		0	R. Dupre	0

Name	Short name	Type	Group	Email	Cost
M. Hattawy		Work	ODU		0
G. Charles		Work	IPN		0
R. Dupre		Work	IPN		0
J. Bettane		Work	IPN		0
W. Armstrong		Work	ANL		0
M. Paolone		Work	Temple		0
R. Wang		Work	IPN		0
Tom and Kevin		Work	ANL		0
